










# 工程結算驗收證明書【工程專用】

結算驗收證明書說明	1.本證明書填發日期為「決行主管」簽核時間。 2.如有列印本證明書作為實績證明或其他用途，應連同簽核頁面整份列印、檢附始為有效之文件。 3.本證明書可至【臺北捷運公司網站/公告資訊/廠商工商憑證簽認平台/「結算驗收證明書查詢」】，或掃描QR Code查詢。
結算驗收證明書QR Code	

流程序號	18620		
案號	A11D00130		
案名	捷運江子翠站、新埔站及新店站包板更新工程		
批次	1		
案件資料	履約單位	工務處土建廠土建四場本部 助理工程師 梁傳楷 (001854)	
	廠商	敦炯營造有限公司 (28443097)	
流程關卡	簽核關卡	順序	名稱
	V	1	承辦單位
	V	2	主驗人
	V	3	會計處監驗人員
	V	4	法政處監驗人員
		5	上級機關監驗人員
	V	6	決行主管
	V	7	廠商
檔案	QM供FM40012工程結算驗收證明書(13).pdf		
說明			

簽核角色	簽核者	簽核意見	簽核	時間	憑證簽章(當簽章字串過長時，會自動切分成多個)
承辦單位	工務處土建廠土建四場本部 助理工程師 梁傳楷 (001854)		上陳	2023-02-17 09:59:02	

承辦單位	工務處土建廠四場本部 場長 葉佳明 (020399)		上陳	2023-02-17 10:14:30	
承辦單位	工務處土建廠本部 副廠長 吳博安 (001528)		上陳	2023-02-17 12:34:06	
承辦單位	工務處土建廠本部 廠長 周廖益 (001349)		上陳	2023-02-17 12:38:51	
承辦單位	工務處本部 副處長 李朝 (001167)		已簽核	2023-02-21 10:19:54	

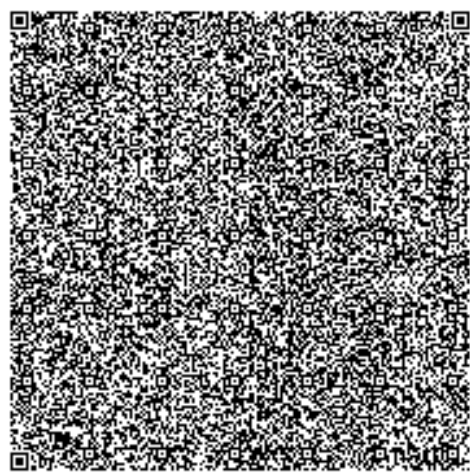
主驗人	工務處土建廠土建三場本部 場長 余英俊 (001228)		已簽核	2023-02-21 14:04:24	
會計處監驗人員	會計處預算課 專員 (二) 林瑋婷 (023845)	【實地監辦】	已簽核	2023-02-22 16:53:48	
法政處監驗人員	法政處稽查課 事務員 邱琴雅 (022563)		改分	2023-02-23 10:12:26	
法政處監驗人員	法政處政風課 助理管理師 陳偉玲 (001996)	【書面審核監辦】	已簽核	2023-02-23 10:47:55	
決行主管	工務處本部 處長 洪銘遠 (000280)		已簽核	2023-02-24 17:59:40	

廠商

敦炯營造有限公司  
(28443097)

完成

2023-03-01  
13:47:24



# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 工程結算驗收證明書

第一聯共三聯

填發日期： 年 月 日 發文字號： 字第 號

案號		A11D00130		廠 商		敦炯營造有限公司	
標的名稱		捷運江子翠站、新埔站及新店站包板更新工程					
採購金額		<input type="checkbox"/> 未達公告金額 <input checked="" type="checkbox"/> 公告金額以上未達查核金額 <input type="checkbox"/> 查核金額以上未達巨額 <input type="checkbox"/> 巨額					
訂約工期		180天		履約地點		捷運江子翠站、新埔站及新店站	
開工日期		111年6月18日		預定竣工日期		111年12月4日	
				不(免)計入工期天數		0	
實際竣工日期		111年12月4日		開始驗收日期		112年1月12日	
				驗收完畢/驗收合格日期		112年2月15日	
履約逾期總天數		0天		不計違約金天數		0天	
				應計違約金天數		0天	
逾期違約金		0		其他違約金		0	
訂約總價		12,679,000					
增減 價 款	次別	第一次		第二次		第三次	
	類別	金 額	簽准日期或核准文號	金 額	簽准日期或核准文號	金 額	簽准日期或核准文號
	增加金額	無	無	無	無	無	無
	減少金額	無	無	無	無	無	無
增減 價 款	次別	結 算		結算後其他調整(註5)		合 計	
	類別	金 額	簽准日期或核准文號	金 額	簽准日期或核准文號		
	增加金額	無	無	616,182	111年12月19日	616,182	
	減少金額	無	無	687,695	111年12月19日	687,695	
驗收扣款		0					
結算總價 (金額中文大寫)		新臺幣 壹仟貳佰陸拾零萬柒仟肆佰捌拾柒元整					
驗收 意見		本案驗收合格					
承辦單位人員及主管簽章		主驗人員簽章					
		本機關 監驗人 員簽章	會計處			(機關印信)	
			法政處				
		上級機關監驗人員簽章 或授權自辦文號		(未達查核金額者免)			

- 註：1、本證明書已含有結算內容者，得免附具「結算明細表」，以資簡化；依實做數量或自行購料僱工辦理者，應附具「結算明細表」。
- 2、本證明書份數為1式4份，由主辦機關單位自存、送主(會)計單位製作憑證之用、交廠商收執、報上級機關備查(查核金額以上)。
- 3、如辦理契約變更或工期展延(含不計工期天數)，應填寫修正核定後之預定竣工日期；「驗收完畢/驗收合格日期」，指政府採購法第七十三條所定「驗收完畢」之日期，亦即參加驗收人員於驗收紀錄會同簽認廠商履約與契約、圖說、貨樣規定相符時之日期。惟其屬減價收受者，指依政府採購法第七十二條第二項報經上級機關核准(查核金額以上)或經機關首長或其授權人核准(未達查核金額)之日期。
- 4、「逾期違約金」及「其他違約金」以預算外或營業外收入處理，不必扣抵結算總價；「其他違約金」，指例如政府採購法施行細則第九十八條第二項所定之減價收受懲罰性違約金。
- 5、結算後其他調整，係如政策指示「物價指數調整」或履約爭議調解或訴訟產生之金額。
- 6、「結算總價」之計算方式為「訂約總價」加「增加金額」減「減少金額」減「驗收扣款」。至主辦機關供給材料及管理費或作業費等契約以外之各項支出均不必合併結算。
- 7、本證明書所定欄位如不敷使用，得新增其他欄位或增補續頁。
- 8、本證明書原則不得塗改，並應循公文處理程序簽核後加蓋驗收機關印信；供機關自存者，得免加蓋機關印信。

# 臺北大眾捷運股份有限公司 工程結算驗收證明書(工程主要內容)

第二聯共三聯

工程名稱		捷運江子翠站、新埔站及新店站包板更新工程			
工程概述		更新捷運江子翠站1~5號出口(含3號出口電梯雨遮)、新埔站1~3號出口及5號出口(含5出口電梯雨遮)及新店站站外電梯包板			
工程主要工項內容及實作數量		瑠璃包板拆除更換680.2平方公尺、1.2骨架更新15公尺、填縫材更新0.9960 式、景觀窗外框格柵拆除更換1式、廢棄物運棄1式、施工圍籬440公尺、高空作業費2339.8平方公尺、材料試驗費1式、建築物與既有設施設備安全防護1式、既有設施移設及復原費用1式、工地清理1式、結構設計及技師簽證費1式、工程告示牌2座、柔性說明告示牌2座、交通維持1式、安全帽5頂、反光背心5套、工作手套30雙、其他安全防護設施0.9943式、安全衛生管理費0.9943 式、品質管理費0.9943式、管理費(含保險)0.9943式、空氣污染防制設施及維護費0.9943 式、噪音防制設施及維護費0.9943 式			
工地工程人員 (註2)	工地主任(負責人)	陳宜泉	工程相關管理單位	專案管理單位	無
	專任工程人員	李宗賢		規劃單位	無
	品管人員	王大松		設計單位	無
	職業安全衛生人員	王雨禾		監造單位	臺北捷運公司工務處土建廠
備註		分包部分情形詳次頁。			
(主辦機關印信)					

註：

- 1、本聯證明書填報方式，詳如「工程結算驗收證明書」作業流程及填報說明。
- 2、「工地工程人員」欄位請填寫竣工時在職之人員資料，餘請填寫至「備註」欄位內。

### 分包部分

本案得標廠商  無報備分包情形  有報備以下分包情形：

分包廠商名稱 (註1)	分包工作主要工項內容 及實作數量	分包項目結算金額 (註2)

註：

- 1、本頁是否填列分包部分資料，由得標廠商決定；其經得標廠商同意於本頁填列分包部分資料者，結算驗收證明書並副知該等分包廠商。
- 2、所列分包廠商名稱須為已報備於機關者。
- 3、所列分包項目結算金額，係以機關與得標廠商間之契約金額（單價）計算，非得標廠商與分包廠商間之契約金額。



編號	種類	姓名/職務/部門	簽核時間	審核結果	審核意見
1	承辦人	梁傳楷 同仁/工務處土建廠土建四場 本部	2022/12/16 14:53:25	送陳(自選)	
2	承辦主管(自選)	葉佳明 主管/工務處土建廠土建四場	2022/12/16 15:02:20	核准	
3	承辦主管(自選)	吳博安 副主管/工務處土建廠	2022/12/16 15:35:53	核准	
4	承辦主管(自選)	周廖益 主管/工務處土建廠	2022/12/16 17:17:29	核准	
5	承辦主管(自選)	李朝聰 副主管/工務處	2022/12/16 17:32:38	核准	







臺北大眾捷運股份有限公司

表單序號: 2022-12-16-0013

採購金額: 12,679,000

結算明細表

第二層決行

案號		A11D00130				廠商		敦炯營造有限公司		
標的名稱		捷運江子翠站、新埔站及新店站包板更新工程				訂約總價		12,679,000		
		契約		結算結果		增減金額				
項次	項目名稱	單位	單價	數量	金額	結算數量	結算金額	增加金額	減少金額	備註
1.1	瑤瑯包板拆除更換	平方公尺	9,000	683	6,147,000	680.2	6,121,800	0	25,200	
1.2	骨架更新	公尺	6,000	75	450,000	15	90,000	0	360,000	
1.3	填縫材更新	式	1,100,000	1	1,100,000	0.996	1,095,600	0	4,400	
1.4	百葉窗拆除更換	處	2	30,000	60,000	0	0	0	60,000	
1.5	屋頂天溝拆除更換	處	2	100,000	200,000	0	0	0	200,000	
1.6	景觀窗外框格柵拆除更換	式	300,000	1	300,000	1	300,000	0	0	
2.1	廢棄物運棄	式	200,000	1	200,000	1	200,000	0	0	
2.2	施工圍籬	公尺	500	370	185,000	440	220,000	35,000	0	
2.3	高空作業費	平方公尺	800	1,650	1,320,000	2,339.8	1,871,840	551,840	0	
2.4	材料試驗費	式	60,000	1	60,000	1	60,000	0	0	
2.5	建築物與既有設施設備安全防护	式	150,000	1	150,000	1	150,000	0	0	
2.6	既有設施移設及復原費用	式	300,000	1	300,000	1	300,000	0	0	
2.7	工地清理	式	200,000	1	200,000	1	200,000	0	0	
2.8	結構設計及技師簽證費	式	300,000	1	300,000	1	300,000	0	0	
2.9	工程告示牌	座	3,000	2	6,000	2	6,000	0	0	
2.10	柔性說明告示牌	座	3,000	2	6,000	2	6,000	0	0	
2.11	交通維持	式	150,000	1	150,000	1	150,000	0	0	
3.1	安全帽	頂	200	5	1,000	5	1,000	0	0	
3.2	反光背心	套	100	5	500	5	500	0	0	
3.3	工作手套	雙	50	30	1,500	30	1,500	0	0	
3.4	其他安全防护設施	式	20,000	1	20,000	0.9943	19,886	0	114	
4	安全衛生管理費	式	60,000	1	60,000	0.9943	59,658	0	342	
5	品質管理費	式	80,000	1	80,000	0.9943	79,544	0	456	
6	管理費(含保險)	式	658,238	1	658,238	0.9943	654,486	0	3,752	
7	空氣污染防制設施及維護費	式	60,000	1	60,000	0.9943	59,658	0	342	
8	噪音防制設施及維護費	式	60,000	1	60,000	0.9943	59,658	0	342	
小計					12,075,238		12,007,130	586,840	654,948	
營業稅					603,762		600,357	29,342	32,747	
合計					12,679,000		12,607,487	616,182	687,695	
承辦單位						決行				

附註:

1. 本表格欄位「單價」、契約「數量」係填列契約變更後之單價及數量。
2. 採購金額500萬元(含)以上案件由二層決行;未達500萬元案件由三層決行。

表單聯絡人(單位:供應處 採購暨契約設計課 姓名:林義祥 電話:10-8440)

第15版

QM-供-FM-40009

