










勞務結算驗收證明書

結算驗收證明書說明	1.本證明書填發日期為「決行主管」簽核時間。 2.如有列印本證明書作為實績證明或其他用途，應連同簽核頁面整份列印、檢附始為有效之文件。 3.本證明書可至【臺北捷運公司網站/公告資訊/廠商工商憑證簽認平台/「結算驗收證明書查詢」】，或掃描QR Code查詢。
結算驗收證明書QR Code	

流程序號	9361		
案號	B11A03077		
案名	捷運中山站美學示範廣告牆改善工作		
批次	1		
案件資料	履約單位	工務處土建廠土建五場 工程員(三) 鄭昕宜 (027583)	
	廠商	新福星營造有限公司 (96918036)	
流程關卡	簽核關卡	順序	名稱
	V	1	承辦單位
	V	2	主驗人
	V	3	會計處監驗人員
	V	4	法政處監驗人員
		5	上級機關監驗人員
	V	6	決行主管
	V	7	廠商
檔案	勞務結算驗收證明書.pdf 結算明細表.pdf		
說明			

簽核角色	簽核者	簽核意見	簽核	時間	憑證簽章(當簽章字串過長時，會自動切分成多個)
承辦單位	工務處土建廠土建五場 工程員(三) 鄭昕宜 (027583)		上陳	2022-11-03 15:04:40	

承辦單位	工務處土建廠土建五場 工程員(三) 鄭昕宜 (027583)		抽回	2022-11-03 15:14:56	
承辦單位	工務處土建廠土建五場 工程員(三) 鄭昕宜 (027583)		上陳	2022-11-03 15:28:54	
承辦單位	工務處土建廠土建五場 場長 張博鈞 (001864)		上陳	2022-11-03 18:56:43	
承辦單位	工務處土建廠本部 副廠長 李昱瑩 (001111)		已簽核	2022-11-07 15:14:11	

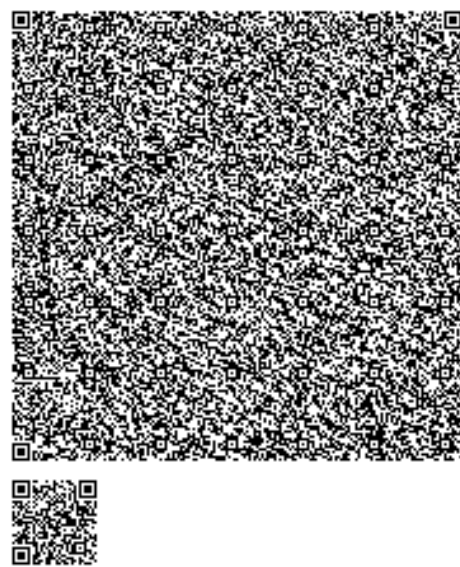
主驗人	工務處土建廠土建三場新莊股 股長 游育民 (001717)		已簽核	2022-11-08 10:54:05	
會計處監驗人員	會計處預算課 專員 (三) 李姍潔 (028110)	【書面審核監辦】	已簽核	2022-11-09 11:07:12	
法政處監驗人員	法政處稽查課 事務員 邱琴雅 (022563)		改分	2022-11-09 11:21:19	
法政處監驗人員	法政處政風課 專員 (一) 林慶嘉 (002038)	【書面審核監辦】	已簽核	2022-11-09 11:31:39	
決行主管	工務處本部 處長 洪銘遠 (000280)		已簽核	2022-11-10 10:51:21	

廠商

新福星營造有限公司
(96918036)

完成

2022-11-10
11:15:57





臺北大眾捷運股份有限公司

勞務結算驗收證明書

填發日期：

發文字號：北捷 字第

號

案號	B11A03077		廠商	新福星營造有限公司			
標的名稱	捷運中山站美學示範廣告牆改善工作						
採購金額	公告金額以上未達查核金額						
履約期限	111年11月03日	履約地點	捷運中山站				
完成履約日期	111年10月20日	開始驗收日期	111年11月03日	驗收完畢/驗收合格日期	111年11月03日		
履約逾期總天數	0	不計違約金天數	0	應計違約金天數	0		
逾期違約金	0		其他違約金	0			
訂約總價	1,473,360						
增減價款	類別	第一次		第二次		第三次	
		金額	額	金額	額	金額	額
增加金額	0	無	0	無	0	無	
減少金額	0	無	0	無	0	無	
增減價款	類別	第四次		結算		合計	
		金額	額	金額	額	金額	額
增加金額	0	無	65,756	111年10月26日	65,756		
減少金額	0	無	76,436	111年10月26日	76,436		
驗收扣款	0						
結算總價	新臺幣 壹佰肆拾陸萬貳仟陸佰捌拾零 元整						
意見	本案驗收合格						
承辦單位人員及主管簽章	主辦人員簽章	機會計處				(未達查核金額者免)	
		本機關監督人員簽章					
		上級機關監督人員簽章或授權自辦文號					
		(機關印信)					

說明：

- 一、本證明書已含有結算內容者，得免附具「結算明細表」，以資簡化；依實做數量或自行購料備工辦理者，應附具「結算明細表」。
- 二、本證明書份數請各機關自行依需要備具，例如由主辦機關自存、送主(會)計單位製作憑證之用、報上級機關備查、交廠商收執。
- 三、「驗收完畢/驗收合格日期」，指政府採購法第七十三條所定「驗收完畢」之日期，亦即參加驗收人員於驗收紀錄會同簽認廠商履約與契約、圖說、貨樣規定相符時之日期。惟其屬減價收受者，指依政府採購法第七十二條第二項報經上級機關核准(查核金額以上)或經機關首長或其授權人核准(未達查核金額)之日期。
- 四、「逾期違約金」及「其他違約金」以預算外或營業外收入處理，不必知照結算總價；「其他違約金」指例如政府採購法施行細則第九十八條第二項所定之減價收受懲罰性違約金。
- 五、「結算總價」之計算方式為「訂約總價」加「增加金額」減「減少金額」減「驗收扣款」。至主辦機關供給材料及管理費或作業費等契約以外之各項支出均不必合併結算。
- 六、本證明書所定欄位如不敷使用，得新增其他欄位或增補續頁。
- 七、本證明書原則不得塗改，並應備公文處理程序登錄後加蓋驗收機關印信；供機關自存者，得免加蓋機關印信。



臺北大眾捷運股份有限公司

表單序號： 2022-10-25-0005

採購金額： 1,693,935

結算明細表

第三層決行

案號		B11A03077				廠商		新福星營造有限公司		
標的名稱		捷運中山站美學示範廣告牆改善工作				訂約總價		1,473,360		
		契約				結算結果		增減金額		
項次	項目名稱	單位	單價	數量	金額	結算數量	結算金額	增加金額	減少金額	備註
1	耐燃一級牆面美耐板	平方公尺	4,697	250	1,174,250	236	1,108,492	0	65,758	
2	牆面圓柱周邊鍍鋅角鋼骨架	處	20,875	3	62,625	6	125,250	62,625	0	
3	墩柱油漆塗裝	平方公尺	782	83	64,906	74	57,868	0	7,038	
4	既有設備暫拆及復舊	式	26,528	1	26,528	1	26,528	0	0	
5	柔性說明告示牌	座	435	1	435	1	435	0	0	
6.1	安全帽	頂	235	6	1,410	6	1,410	0	0	
6.2	安全鞋	雙	1,305	6	7,830	6	7,830	0	0	
6.3	工作手套	雙	43	6	258	6	258	0	0	
6.4	反光背心	件	191	6	1,146	6	1,146	0	0	
7	安全衛生管理費	式	13,297	1	13,297	1	13,297	0	0	
8	管理費(含保險費)	式	50,515	1	50,515	1	50,515	0	0	
小計					1,403,200		1,393,029	62,625	72,796	
營業稅					70,160		69,651	3,131	3,640	
合計					1,473,360		1,462,680	65,756	76,436	
承辦單位						決行				

附註：

1. 本表格欄位「單價」、「契約數量」係填列契約變更後之單價及數量。
2. 採購金額500萬元(含)以上案件由二層決行；未達500萬元案件由三層決行。

表單聯絡人(單位：供應處 採購暨契約設計課 姓名：林義祥 電話：10-8440)

QM-供-FM-40009

第15版





編號	種類	姓名/職務/部門	簽核時間	審核結果	審核意見
1	承辦人	鄭昕宜 同仁/工務處土建廠土建五場	2022/10/25 17:06:24	送陳(自選)	
2	承辦主管(自選)	陳志鴻 同仁/工務處土建廠土建五場	2022/10/25 17:45:56	核准	
3	承辦主管(自選)	張博鈞 主管/工務處土建廠土建五場	2022/10/25 17:53:39	核准	
4	承辦主管(自選)	李昱瑩 副主管/工務處土建廠	2022/10/26 08:35:58	核准	
5	承辦主管(自選)	周廖益 主管/工務處土建廠	2022/10/26 12:36:52	核准	

